

SENA · TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Aura Beauty

Proceso de Implantación de Software

Sofia Jaramillo Ortiz

Maicol Esteban Franco Roman

Estefania Herrera Sanchez

Ficha 3147206

Instructor: Carlos Alberto Ocampo

2026


CONTEXTO DEL PROYECTO

¿Qué es Aura Beauty?

Plataforma web de reseñas de maquillaje que informa y guía a los usuarios mediante reseñas, calificaciones, imágenes, videos y recomendaciones personalizadas.

Resuelve la falta de un espacio confiable y centralizado para reseñas de productos, la gestión manual y dispersa, la poca interacción social y las limitaciones de privacidad y accesibilidad.

Metodología de implantación — 7 fases



FASE 1 · PLANIFICACIÓN

Planificación

3 meses

Duración total

31 jul – 31 oct 2026

13 hitos

Puntos de control

Del cronograma (EDT/WBS)

\$35,1M

Presupuesto (COP)

Infraestructura + talento +
capacitación

RACI

Roles definidos

Responsable, Aprobador,
Consultado, Informado

- Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) construida sobre los 20 requisitos de prioridad Muy Alta.
- Plan de contingencia: estrategia de rollback, ventanas de mantenimiento (domingos 11 p. m. – 2 a. m.) y backups diarios/semanales.
- Holgura de 1–2 días por subfase, más 7 días de colchón general al cierre del proyecto.

FASE 2 · PREPARACIÓN DEL ENTORNO

Preparación del Entorno

Arquitectura tecnológica propuesta

Frontend

React + Vite

Backend

Node.js + Express

Base de Datos

PostgreSQL

Hosting

Servicios en la nube

4 entornos de trabajo

Desarrollo → QA → Staging → Producción, cada uno con su propia base de datos y nivel de acceso.

Seguridad y roles (RBAC)


Tres roles de acceso: usuario final, moderador y administrador, cada uno con permisos diferenciados.

FASE 3 · MIGRACIÓN DE DATOS

Migración de Datos

Aura Beauty es un proyecto nuevo: no hay sistema anterior que migrar, por lo que esta fase se enfoca en la carga inicial de datos semilla (seed data).

Proceso ETL aplicado a la carga inicial

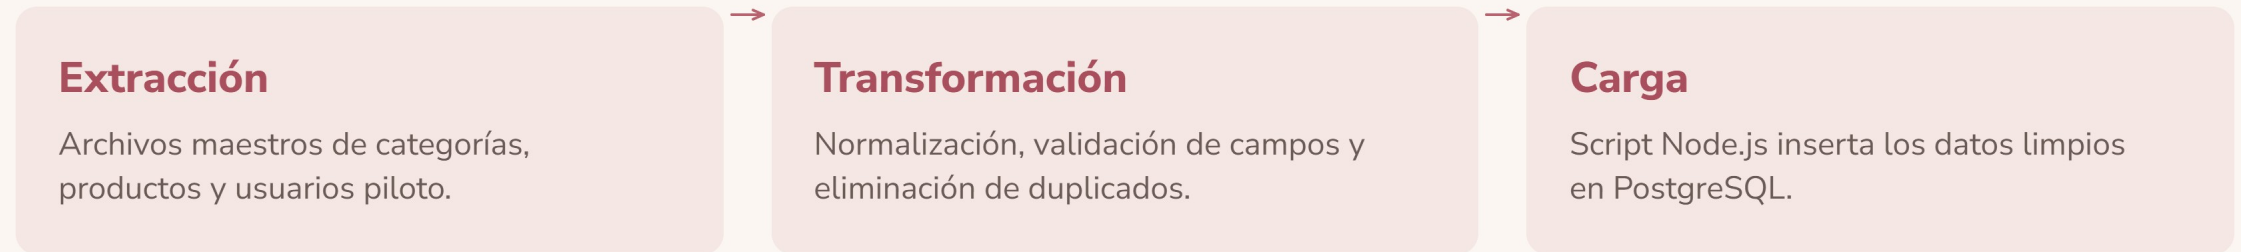

- Estrategia incremental: roles → categorías → productos → usuarios → reseñas de ejemplo.
- Pruebas de conciliación: conteos exactos e integridad referencial antes de pasar a UAT.

FASE 4 · PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT)

36

Casos de prueba
UAT-01 a UAT-36

8

Módulos priorizados
De 16 módulos identificados

231

Requisitos trazados
Matriz de
trazabilidad completa

0

Defectos críticos
Criterio de salida obligatorio

- Ejecutadas por usuarios beta sobre el entorno de Staging, con datos semilla ya cargados.
- Cubren funcionalidad, usabilidad, accesibilidad y seguridad de los requisitos de prioridad más alta.
- Cierre de la fase con firma de aceptación (sign-off) del equipo del proyecto.

Manual de Usuario Final

Documento de apoyo dirigido al usuario final, sin capturas de pantalla reales ya que la interfaz aún está en desarrollo.

Acceso y seguridad

Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña y verificación en dos pasos.

Reseñas y calificaciones

Publicación de reseñas con texto, imágenes y video; calificación por estrellas.

Búsqueda y perfil

Búsqueda avanzada, edición de perfil y control de privacidad de la información.

Accesibilidad y soporte

Modo oscuro, lectores de pantalla, redes sociales, centro de ayuda y FAQ.

FASE 5 · CAPACITACIÓN DE USUARIOS

Capacitación de Usuarios

Estrategia en cascada (Train the Trainer): el equipo técnico forma a los usuarios clave, quienes replican el conocimiento internamente.

Perfil	Enfoque de la capacitación	Duración
Usuario final	Manual de Usuario y Centro de Ayuda integrado	Autoguiada
Moderador	Panel de moderación: aprobar/rechazar reseñas reportadas	2 horas
Administrador	Gestión de usuarios, roles y permisos (RBAC)	3 horas
Soporte técnico	Contraseñas, permisos y respaldos de base de datos	Continua

FASE 6 · PUESTA EN PRODUCCIÓN

Puesta en Producción

Ejercicio simulado: el software de Aura Beauty aún está en desarrollo. Este documento aplica la metodología a un escenario hipotético de lanzamiento.

Plan de despliegue simulado (Cutover Plan)



- Estrategia piloto/por fases: grupo beta primero, apertura gradual al público general después.
- Plan de rollback disponible para revertir el despliegue ante una falla crítica.

FASE 7 · SOPORTE POST-IMPLANTACIÓN

Soporte Post-Implantación (Hypercare)

Periodo de hipercuidado de 3 semanas posteriores al lanzamiento, con dedicación prioritaria del equipo del proyecto.

Nivel 1 — Soporte Operativo

Dudas de uso de la plataforma, atendidas por moderadores (usuarios clave).

Nivel 2 — Soporte Técnico

Fallas de configuración, base de datos o caídas del servicio, atendidas por administradores.

- Reunión de retrospectiva y documento de lecciones aprendidas al cierre del hipercuidado.
- Transferencia de operaciones (handover): manuales, accesos y bitácoras al mantenimiento regular.

CIERRE

Conclusiones

- Las 7 fases del proceso de implantación de Aura Beauty quedaron documentadas siguiendo la metodología del curso.
- El equipo definió planificación, entorno técnico, datos, pruebas, capacitación, despliegue y soporte de forma trazable entre sí.
- Próximo paso: iniciar el desarrollo técnico real y ejecutar el cronograma del 31 de julio al 31 de octubre de 2026.

Sofia Jaramillo Ortiz

Maicol Esteban Franco Roman

Estefania Herrera Sanchez

Gracias
